

工程安全监督巡查、抽查记录回复单

工程名称	保山学院健康服务与管理人才培养及实训基地建设项目				
施工单位	云南保山下村建筑工程有限责任公司				
建筑层数	三层/五层	结构类型	框架结构	建筑面积	21030.36 m²
检查时间	2024 年 1 月 12 日	检查部位			

检查提出的问题：

一、重大事故隐患排查整治 2023 行动、岁末年初安全、危大工程检查：

1. 基坑（局部超 3m）未编制单独的专项施工方案；

2. 高支模（1#实训楼主席台高 17.90m，2#楼实训楼门厅 8.28m）超危大工程未组织专家论证；

3. 所有危大工程专项方案审核总监未加盖执业印章；

4. 临时用电未按规定要求设置总配电房，接地绝缘电阻检测未形成痕迹记录，安装未组织验收，无电工巡视检查记录；

5. 施工现场未粘贴重大事故判定宣传画册。

二、消防安全检查：

1. 未编制施工现场临时消防专项方案；

2. 项目部未配备灭火器。

三、安全生产“三件套”：未落实“三件套”措施。

四、安全日志：该项目未填写安全日志。

五、扬尘治理：

1. 未编制扬尘治理方案；

2. 需加大洒水降尘力度。

六、禁毒防艾：未开展禁毒防艾宣传工作，并留痕迹资料。

七、焊接与切割作业专项整治：电焊工未签署承诺书。

八、地质灾害时汛前排查：

1. 该项目不存在地质灾害隐患；

2. 施工单位做好汛前物资储备工作。

九、安全手册配备情况：该项目未配备安全手册。

整改情况：

一、重大事故隐患排查整治 2023 行动、岁末年初安全、危大工程检查：

1. 基坑局部超 3m 部分经五方责任体现场查勘由设计单位设计，采用挡土墙支护桩进行支护，已编制基坑支护工程专项施工方案并报监理审核通过；

2. 高支模（1#实训楼主席台高 17.90m，2#楼实训楼门厅 8.28m）超危大工程已报专家组进项初审，待初审完成后择日进行论证；

3. 所有危大工程专项方案审核总监已加盖执业印章；

4. 目前总配电柜已采购至施工现场，现正按规范要求安装总配电柜，因施工工序因素，总配电房设置预计 2024 年 1 月 28 日安装完毕。届时再进行接地绝缘电阻检测及记录，并组织安装验收，投入使用后电工定期做巡视检查、记录；

5. 已粘贴重大事故判定宣传画册。

二、消防安全检查：

1. 已编制施工现场临时消防专项方案并报监理单位审核；

2. 项目部已配备灭火器。

三、安全生产“三件套”：安全生产“三件套”措施已落实。


四、安全日志：项目安全日志已填写。

九、安全手册配备情况：项目已配备安全手册。


复查时间： 年 月 日

工程安全监督巡查、抽查整改图片

基坑（局部超 3m）未编制单独的专项施工方案整改前

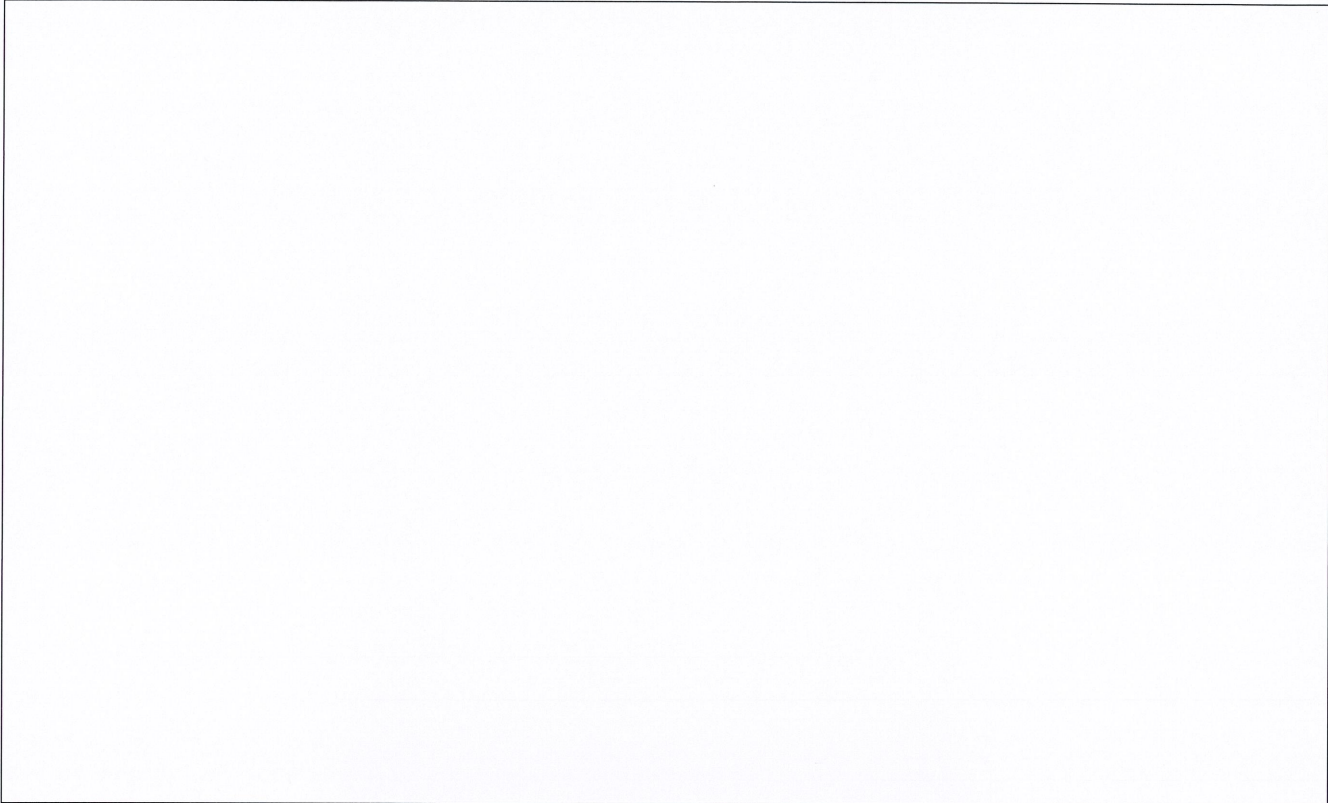


基坑（局部超 3m）未编制单独的专项施工方案整改后

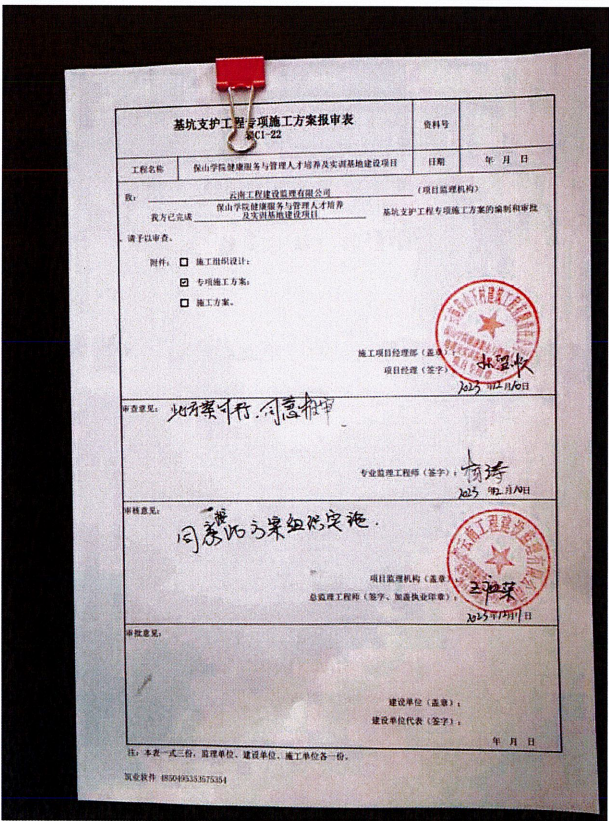

工程安全监督巡查、抽查整改图片

高支模（1#实训楼主席台高 17.90m，2#楼实训楼门厅 8.28m）超危大工程未组织专家论证整改前

高支模（1#实训楼主席台高 17.90m，2#楼实训楼门厅 8.28m）超危大工程未组织专家论证整改后

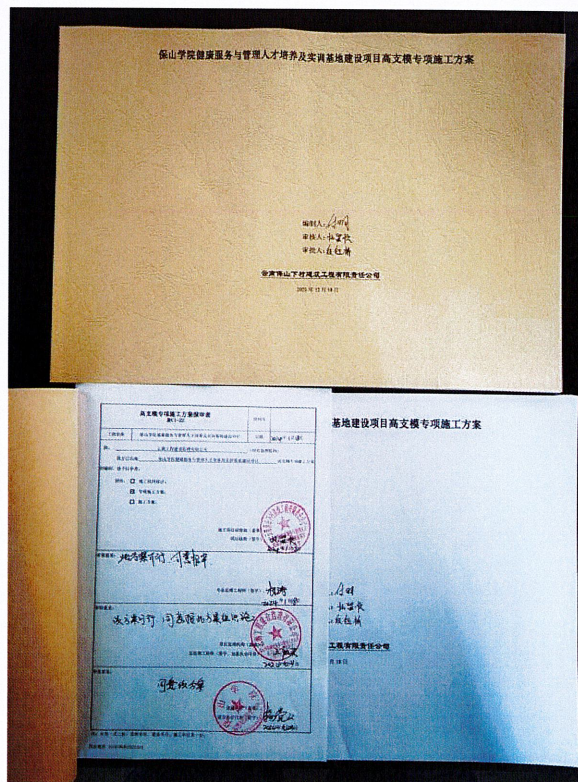

工程安全监督巡查、抽查整改图片

所有危大工程专项方案审核总监未加盖执业印章整改前

所有危大工程专项方案审核总监未加盖执业印章整改后



工程安全监督巡查、抽查整改图片

临时用电未按规范要求设置总配电房，接地绝缘电阻检测未形成痕迹记录，安装未组织验收，无电工
巡视检查记录整改前

临时用电未按规范要求设置总配电房，接地绝缘电阻检测未形成痕迹记录，安装未组织验收，无电工
巡视检查记录整改中



工程安全监督巡查、抽查整改图片

施工现场未粘贴重大事故判定宣传画册整改前

施工现场未粘贴重大事故判定宣传画册整改后



工程安全监督巡查、抽查整改图片

未编制施工现场临时消防专项方案整改前

未编制施工现场临时消防专项方案整改后

施工现场临时消防专项方案报审表
表C1-22

工程名称	保山学院健康服务与管理人才培养及实训基地建设项目	日期	2024年1月16日
编制人	云南工程建设集团有限公司	审核人	
我方已完成《保山学院健康服务与管理人才培养及实训基地建设项目》施工现场临时消防专项方案的编制，请予以审查。			
附件： ☐ 施工组织设计； ☒ 专项方案； ☐ 施工方案。			
施工项目经理部（盖章）： 项目经理（签字）：[签字] 2024年1月16日			
审查意见：此方案可行，同意报审。			
专业监理工程师（签字）：杨振源 2024年1月17日			
审核意见：同意此方案。			
项目监理机构（盖章）： 总监理工程师（签字，加盖执业印章）：王旭东 2024年1月17日			
审批意见：			
建设单位（盖章）： 建设单位代表（签字）： 年 月 日			

注：本表一式三份，监理单位、建设单位、施工单位各一份。
附件软件：6850495353573354

工程安全监督巡查、抽查整改图片

项目部未配备灭火器整改前

项目部未配备灭火器整改后



工程安全监督巡查、抽查整改图片

未落实“三件套”措施整改前


未落实“三件套”措施整改后



工程安全监督巡查、抽查整改图片

项目未填写安全日志整改前

项目未填写安全日志整改后

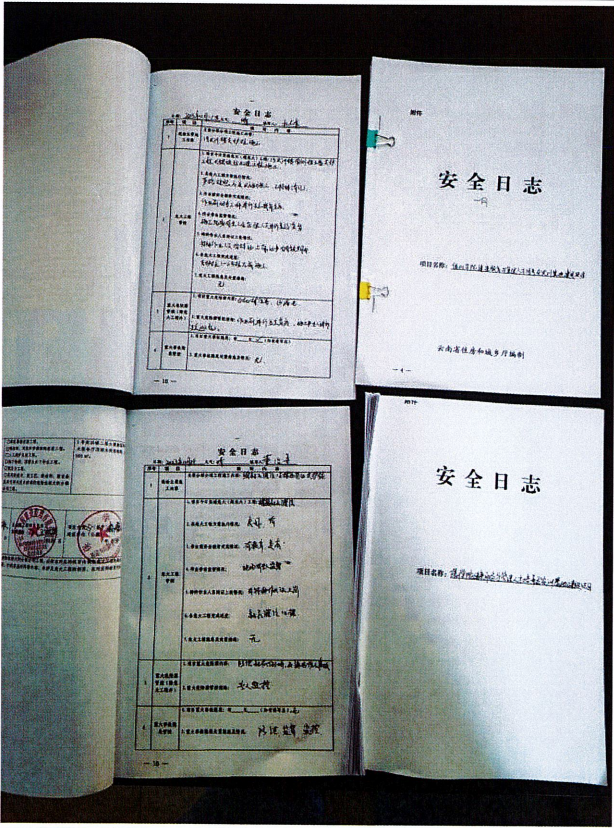

工程安全监督巡查、抽查整改图片

未编制扬尘治理方案整改前

未编制扬尘治理方案整改后


扬尘控制专项方案申报表
表C1-22

工程名称	保山学院健康服务与管理人才培养及实训基地建设项目	日期	2024年1月21日
致:	云南工程建设监理有限公司 (项目监理单位)		
我方已完成	保山学院健康服务与管理人才培养及实训基地建设项目 扬尘控制专项方案的编制, 请予以审查。		
附件:	☐ 施工组织设计; ☒ 专项方案; ☐ 施工方案。		
施工单位项目经理 (盖章):	[Red Seal]		
项目经理 (签字):	[Signature]		
审核意见:	此方案可行, 同意申报		
专业监理工程师 (签字):	[Signature]		
审核意见:	同意按此方案组织实施		
项目监理单位 (盖章):	[Red Seal]		
总监理工程师 (签字, 加盖执业印章):	[Signature]		
审核意见:			
建设单位 (盖章):			
建设单位代表 (签字):			

注: 本表一式三份, 监理单位、建设单位、施工单位各一份。
执业软件 485049833675354

工程安全监督巡查、抽查整改图片

需加大洒水降尘力度整改前




需加大洒水降尘力度整改后



工程安全监督巡查、抽查整改图片

未开展禁毒防艾宣传工作，并留痕迹资料整改前

未开展禁毒防艾宣传工作，并留痕迹资料整改后



工程安全监督巡查、抽查整改图片

电焊工未签署承诺书整改前

电焊工未签署承诺书整改后



工程安全监督巡查、抽查整改图片


汛前物资储备工作整改前

汛前物资储备工作整改后



工程安全监督巡查、抽查整改图片

项目未配备安全手册整改前



项目未配备安全手册整改后

