

保山市小地方水库工程建设管理局关于水利 工程建设安全生产监督检查问题的整改情况汇报

保山市水务局：

2017年10月12日省水利厅、保山市水务局、腾冲市水务局安全生产联合监督检查执法组领导和专家一行到小地方水库建设工地开展水利安全生产监督检查，检查后给我们指出了6个安全生产问题。安全无小事，针对省市县领导和专家现场监督检查给我们指出来的问题，小地方水库工程建设管理局13日即组织所涉及的单位召开会议，对整改工作进行全面的布署安排，限期完成，现将具体的整改落实情况汇报如下。

1、2#输水隧洞施工无危险源告知牌事，经现场落实，现已整改到位（见图照一）；

2、2#输水隧洞焚烧装水泥的塑料编织袋事，当日责令施工单位停烧，事后集中清运到弃渣场填埋处理，施工单位已办理；

3、2#输水隧洞物料堆码场地脏乱差事，会议责令施工单位进行规范，现已整改落实（见图照二）；

4、2#输水隧洞施工电线路不规范存在安全隐患事，会议责令其安排电工进行处理，电工对线路进行该拆除的拆除、该绑扎的绑扎，基本消除了凌乱现象，做到了安全供用电（见



图照三);

5、主(副)坝施工单位石料场线路不规范事,施工方及时进行了整改,现已符合安全供用电要求(见图照四);

6、进库区交通道路条件不好存在安全隐患事,管理局在13日会上通过共同分析研究认为,该进库(进村)公路较窄,山势险峻,地质条件不好,主坝施工与公路保通相矛盾,路道扩修困难,安全隐患突显,要保安全、保施工只有责成主坝施工单位加强管理,采取增加护路人员对道路进行维护,在危险路段加装栅栏、彩条和安全警示标牌,施工中派专人持对讲机在道路两端指挥车辆通行,真正缓解该路段的交通安全压力还有待新修的进库(进村)公路建成。目前主坝施工单位已按会议要求执行(见图照五~七),安全风险基本可控。

此次上级领导和专家组到小地方水库进行安全检查工作是对我们的关心和厚爱,监督检查中发现和指出的问题充分说明我们的安全管理工作还有很多不足,安全措施还要细划,安全管理水平和责任心还有待进一步提高。在此我们诚心诚意地接受并进行整改,同时希望领导和专家们能有更多的时间到小地方水库工地指导工作,给我们传经送宝,使我们的安全生产工作做得更加扎实,把安全生产事故消灭在萌芽状态。

附件: 1、水利安全生产检查督办通知单; 2、主坝施工



项目部和 2#输水隧洞项目部整改报告。

此汇报。

保山市小地方水库工程建设管理局

2017年10月20日



抄报：腾冲市水务局安监股



图照一：2#输水隧洞危险源告知牌

保山市小地方水库2#输水隧洞工程

隧洞施工危险源告知牌

序号	作业活动	危险因素	控制措施
1	施工临时用电	触电	严格按临时用电规范要求架设线路，电工持证上岗，电工人员加强线路检查与维修，严禁非电工进行电工作业。
2	风钻凿眼	尘肺	禁止干式钻孔，加强通风除尘，作业人员必须佩戴防尘口罩、防护镜、防尘帽等劳动防护用品。
3	爆破施工	爆炸、塌方、中毒窒息	严格按爆破作业安全操作规程，使用符合标准的爆破器材，根据隧道爆破方案设置炮位，爆破后做好通风，严禁冒险作业。
4	出渣与运输	物体打击、机械伤害、车辆伤害	出渣前必须进行排险，清理浮石危岩，作业面照明必须充足，出渣时禁止人员站在机械设备之间，运输车辆必须处于完好状态，制动、照明有效，禁止超载、超宽、超高，洞内车辆行驶速度不宜超过10km/h，倒车卸渣时应有专人指挥，严格按《二三隧洞施工技术规范》作业。
5	初期支护	塌方、尘肺	全方位及时支护，喷浆作业人员必须佩戴防尘口罩、防护镜、防尘帽等劳动防护用品，严格按《公路隧道施工技术规范》施工。
6	二次衬砌	高处坠落	正确佩戴个人防护防护用品（安全帽、安全带、防滑鞋等）；经常检查高处作业平台的底板是否牢固，是否满铺，四周是否用安全网防护到位。


禁止吸烟


禁止明火


禁止带火种


禁止酒后作业


禁止违章指挥


禁止违章作业


当心火灾


当心机械伤人


当心触电


当心落物


当心车辆


当心坠落


图照二：整理后的 2#输水隧洞物料场



图照三：整理后的 2#输水隧洞线路



图照四：整理后的主坝石料场施工电线路

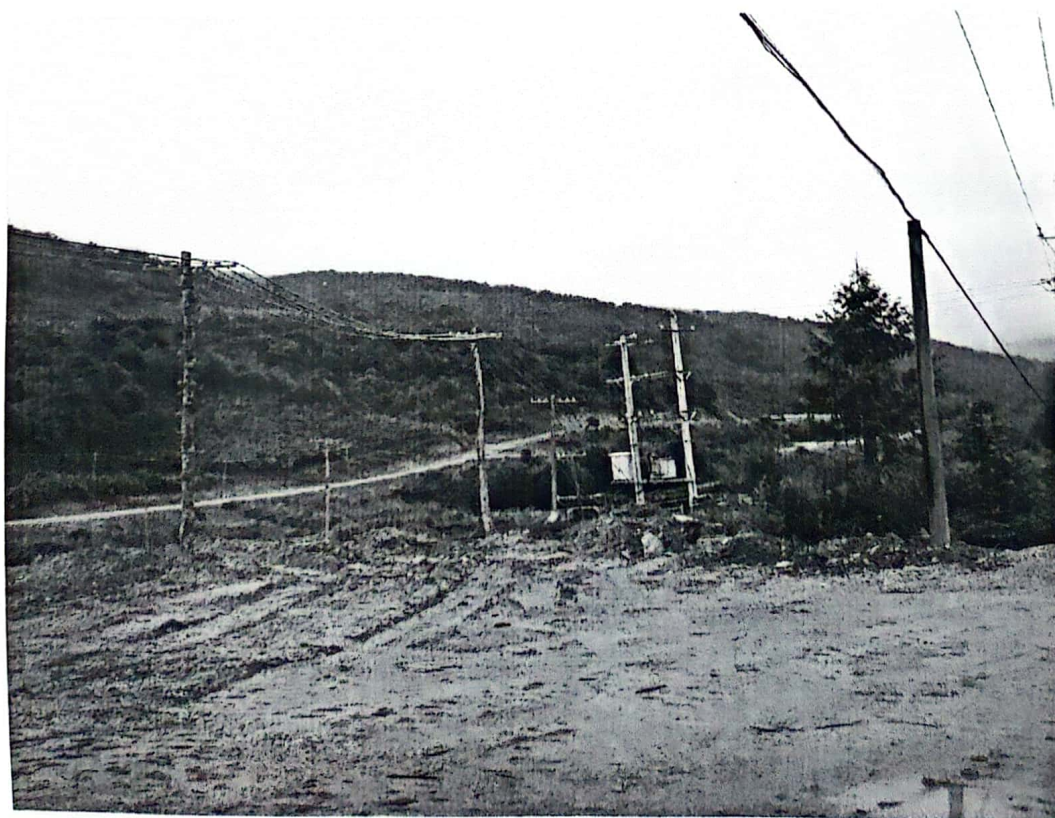

图照五：主坝施工单位立的路旁栅栏、彩条



图照六：指挥交通场景



图照七：安全警示标牌

